



Endausbau des Baugebietes „Röthe II“ in Kirchhain





VORTRAGSGLIEDERUNG

- Kurzvorstellung Dipl.-Ing. Gringel GmbH
- Vorstellung Ausbauplanung
- Kosten und Termine




KURZVORSTELLUNG DIPL. – ING. GRINGEL GmbH

- Ingenieurbüro für Tief- und Straßenbau
- Zugehörigkeit zur Ingenieurgruppe Battenberg & Koch
- ca. 70 Mitarbeiter / 13 davon in Marburg

Leistungsspektrum:

- Planung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken
- Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung/ Kanalsanierung
- Städteplanerische Leistungen
- Bauüberwachung/ Bauoberleitung
- Entwurfs- und Bauvermessung
- Nachtragsmanagement



KURZVORSTELLUNG BEARBEITER

Ansprechpartner: Stadt Kirchhain, Herr Sammet (Fachbereich 4)

Überarbeitung Planung


- Michael Schmidt, 40 Jahre, Dipl.-Ing. (FH) / Laura Werner, 26 Jahre, B. Eng.
- 13 Jahre Berufserfahrung bzw. 2 Jahre

Ausschreibung / Bauüberwachung / Bauoberleitung

- Eckhardt Petersohn, 59 Jahre, Dipl.-Ing. (FH) / Patrick Schmidt, 29 Jahre, B. Eng
- 33 Jahre Berufserfahrung bzw. 5 Jahre

Projektauswahl

- Ausbau „Amöneburger Tor“ und „Untergasse“ in Kirchhain
- Erneuerung Bahnhofumfeld Kirchhain, Quartier Busbahnhof, Feldweg, P+R Anlage
- Endausbau Baugebiet „In dem Baumgarten“ im Stt. Niederwald




VORSTELLUNG AUSBAUPLANUNG - LAGEPLAN




VORSTELLUNG AUSBAUPLANUNG „Franz-Schubert-Straße“



- Gehweganbindung an die „Georg-Friedrich-Händel-Straße“ zur Vervollständigung des Wegenetzes, durchgehende Breite vom 1,50 m
- Ausführung der Gehwege wie im Bestand in Pflasterbauweise mit Bord



Schnitt A - Franz-Schubert-Straße

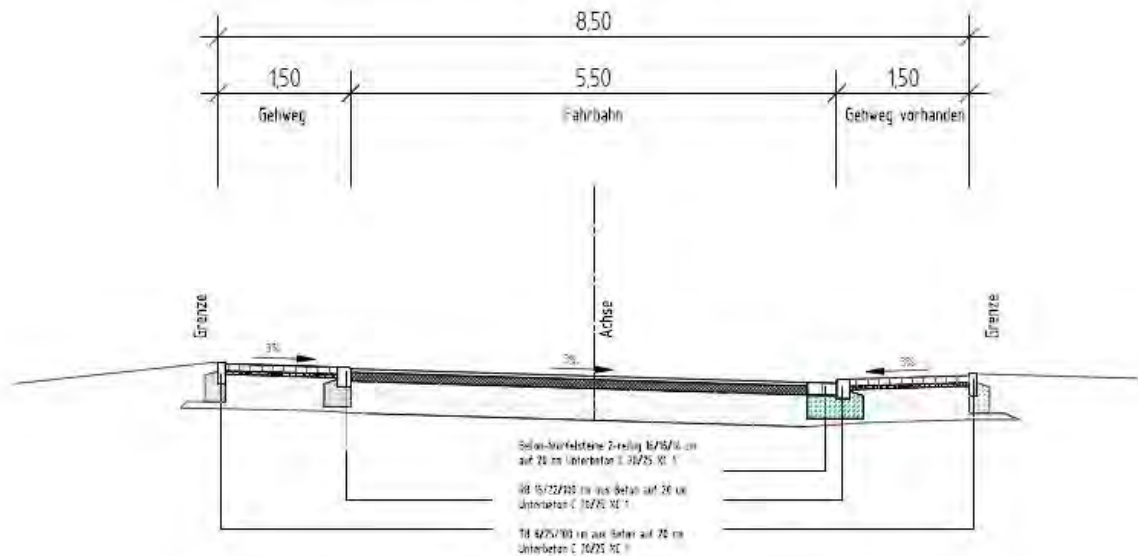

Deckenaufbau nach RST0 12, Bk 0,3

Endausbau Fahrbahn

4 cm Asphaltbetontragschicht 0 / 8 mm

10 cm bit. Tragtschicht 0 / 32 mm

36 cm Frostschuttschicht 0 / 45 mm

50 cm

Gehweg

8 cm Betonsteinpflaster


4 cm Splitt 2 / 5 mm

38 cm Frostschuttschicht 0 / 45 mm


50 cm




VORSTELLUNG AUSBAUPLANUNG „Richard-Strauss-Straße“

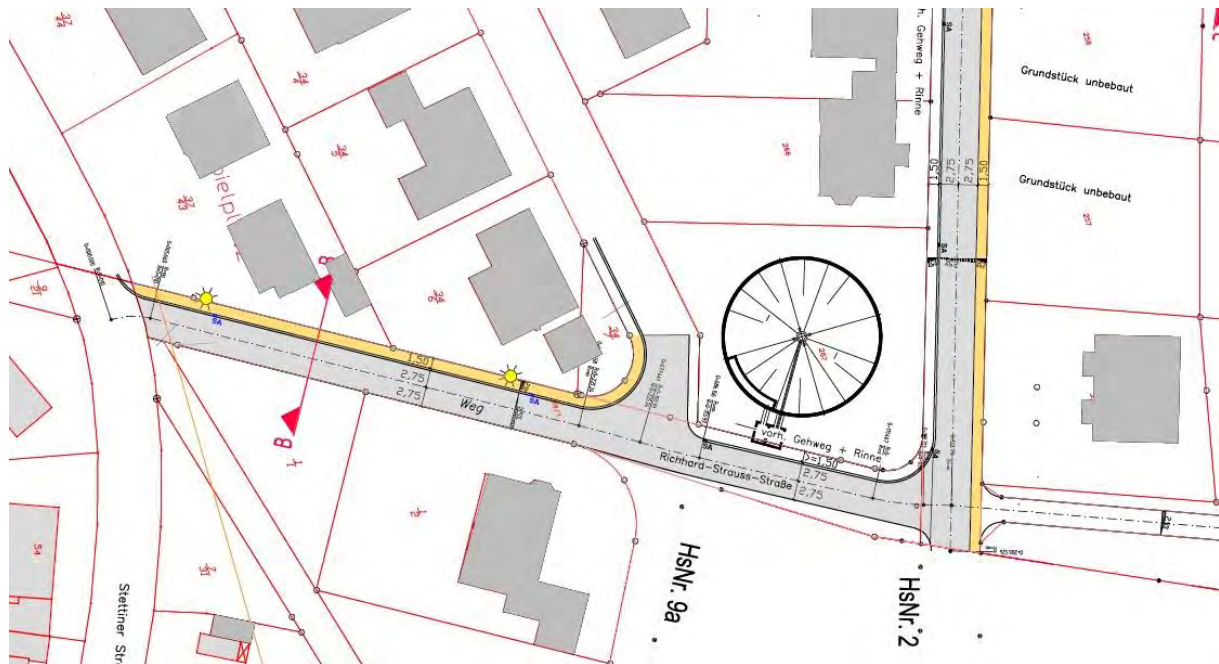

- Gehweganbindung an die „Weimarer Straße“ zur Vervollständigung des Wegenetzes, durchgehende Breite vom 1,50 m
- Anbindung und Fortführung an vorhandene Entwässerungsrinne in der „Weimarer Straße“ und Bord



Schnitt B - Richard-Strauss-Straße

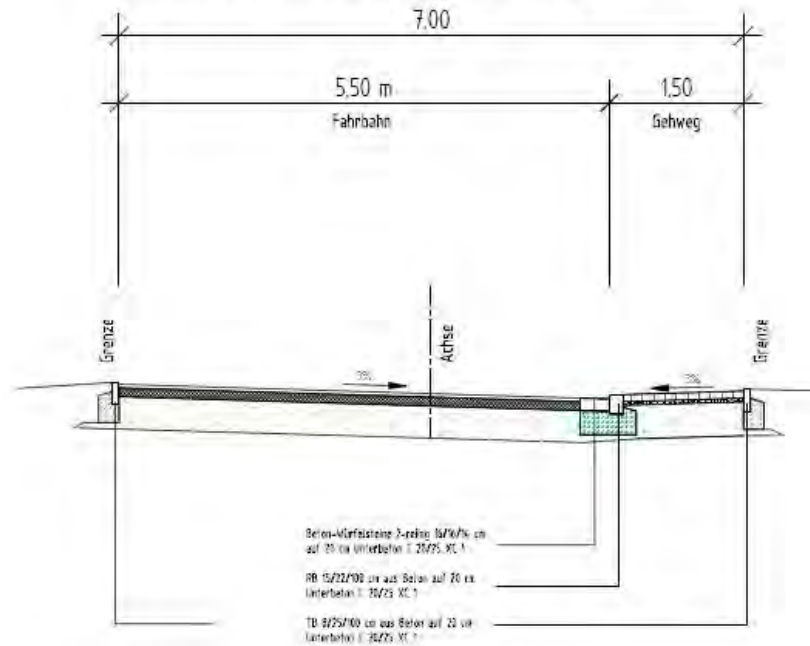


Deckenaufbau nach RST0 12, Bk 0,3

Endausbau Fahrbahn


- 4 cm Asphaltbetondeckschicht 0 / 8 mm
- 10 cm bit. Tragschicht 0 / 32 mm
- 36 cm Frostschuttschicht 0 / 45 mm
- 50 cm

Gehweg

- 8 cm Betonsteinpflaster
- 4 cm Splitt 2 / 5 mm
- 38 cm Frostschuttschicht 0 / 45 mm
- 50 cm




VORSTELLUNG AUSBAUPLANUNG - LAGEPLAN

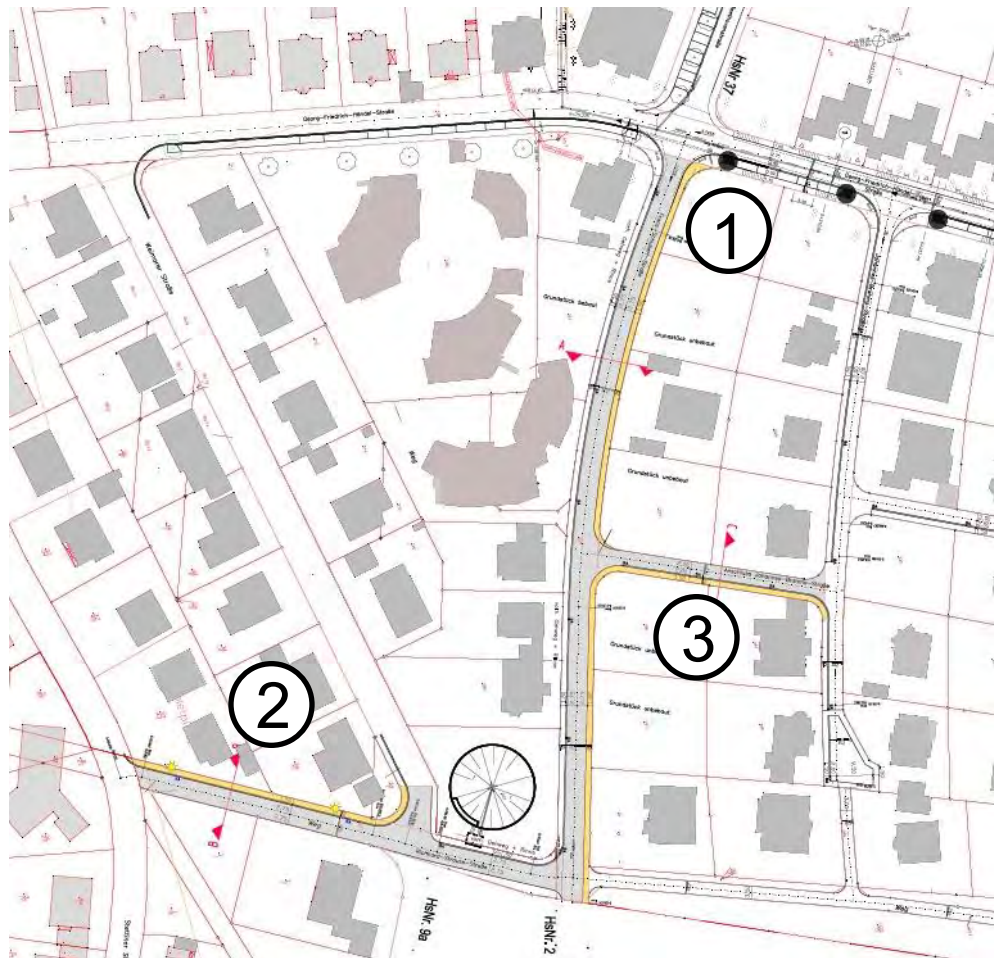


VORSTELLUNG AUSBAUPLANUNG „Anschluss Johannes-Brahms-Straße“



- Gehweganbindung an die „Johannes-Brahms-Str.“ zur Vervollständigung des Wegenetzes, einseitig durchgehender Gehweg mit einer Breite von 1,50 m
- Anschluss an bestehende Entwässerungsrinne in „Johannes-Brahms-Str.“



Schnitt C - Anschluss Johannes-Brahms-Straße

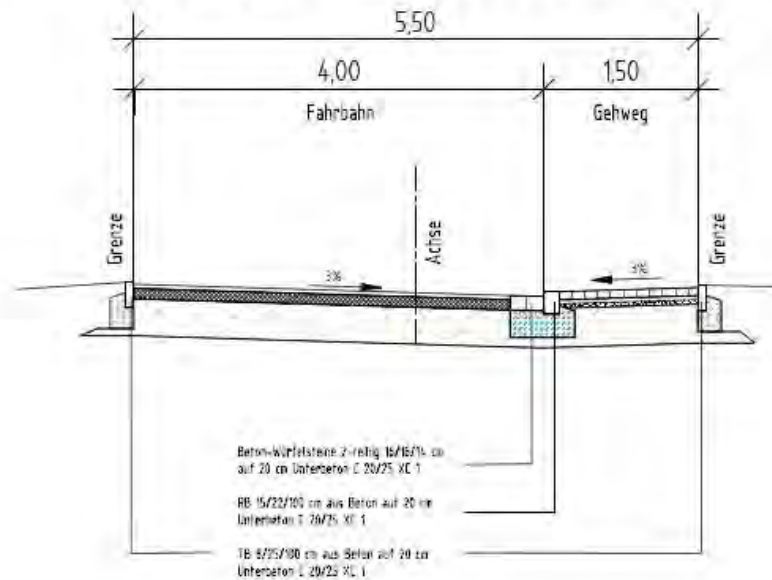

Deckenaufbau nach RST0 12, Bk 0,3

Endausbau Fahrbahn

4 cm Asphaltbetondeckschicht 0 / 8 mm

10 cm bit. Tragschicht 0 / 32 mm

36 cm Frostschuttschicht 0 / 45 mm

50 cm


Gehweg

8 cm Betonsteinpflaster

4 cm Splitt 2 / 5 mm

38 cm Frostschuttschicht 0 / 45 mm

50 cm



KOSTEN DER MAßNAHME:


- Voraussichtliche Kosten rund 170.000 € brutto
- kalkuliert nach marktüblichen Preisen

TERMINSCHIENE:

- Voraussichtlicher Baubeginn: Mitte Mai 2017
- Voraussichtliche Bauzeit: 3 Monate




Stadt Kirchhain



Dipl.- Ing. Gringel GmbH
Ingenieurbüro für Bauwesen

**Vielen Dank
für
ihre Aufmerksamkeit.**



• Kontakte

Magistrat der Stadt Kirchhain:

- Herr Sammet, Tel.: 06422 - 808 – 230, E-Mail: t.sammet@kirchhain.de
- Herr Stey, Tel.: 06422 - 808 – 233, E-Mail: s.stey@kirchhain.de
- Herr Dornseif, Tel.: 06422 - 808 – 200, E-Mail: v.dornseif@kirchhain.de

Ingenieurbüro Gringel:

- Herr Battenberg, Tel. 06421 – 94 818 - 21, E-Mail: sbattenberg@ing-buero-gringel.de
- Herr P. Schmidt, Tel. 06421 – 94 818 - 17, E-Mail: pschmidt@ing-buero-gringel.de
- Frau Werner, Tel. 06421 – 94 818 - 15, E-Mail: lwerner@ing-buero-gringel.de
